

# Neugestaltung der Kaiserstraße

## Information März 2024

Stand der Arbeiten und Ausblick

### Ausblick über die anstehenden Arbeiten ab Ende Februar bis Ende April

Zu Beginn des Jahres kam es leider zu witterungsbedingten Unterbrechungen in einzelnen Arbeitsschritten (siehe auch Abbildung 6). Aufgrund der kalten Temperaturen war der Untergrund und das Material teilweise gefroren und einzelne Arbeitsschritte, wie beispielsweise die Verlegung des Pflasters oder Leitungsverlegungen, konnten nicht direkt nach Jahresbeginn starten. Dennoch liegen die Arbeiten weiterhin sehr gut im Zeitplan. Zeitnah werden nun die bereits begonnenen Arbeiten in den Baufeldern gemäß Abbildung 1 und 2 weiter ausgedehnt.

Oberstes Ziel ist es, auch in diesen Baufeldern die Erreichbarkeit der einzelnen Geschäfte und Gebäudeeingänge zu gewährleisten. Hierfür müssen die Arbeiten teilweise sehr kleinteilig ausgeführt werden. Zur besseren Übersicht sind daher unten die einzelnen vorgesehenen Arbeitsschritte aufgeführt.

Im März werden im Baufeld 3b folgende Leistungen ausgeführt:

- Verlegung der Hausanschlussleitungen für die Versorgung der Gebäude mit Gas, Wasser und Strom
- Pflasterarbeiten in der Einmündung der Kreuzstraße
- Tief- und Straßenbauarbeiten zur Vorbereitung der Pflasterarbeiten. Darunter fällt beispielsweise die Herstellung der Schotter- und Dränbetontragschichten.

Im Baufeld 5b werden folgende Leistungen vorgesehen:

- Verlegung der Leitungen für die Stromversorgung und die neue Straßenbeleuchtung
- Verlängerung der Arbeiten für die Tiefbau- und Pflasterarbeiten bis zur Ritterstraße einschließlich des Einmündungsbereichs der Ritterstraße. Dazu muss die Ritterstraße für den Kfz- Verkehr voll gesperrt werden.
- In diesem Baufeld wird im Zuge der Pflasterarbeiten das Zierband in der Mitte der Kaiserstraße final hergestellt.

Die Zugänge zu den Haltestellen auf Höhe der Ritterstraße bleiben für Fußgänger erreichbar.

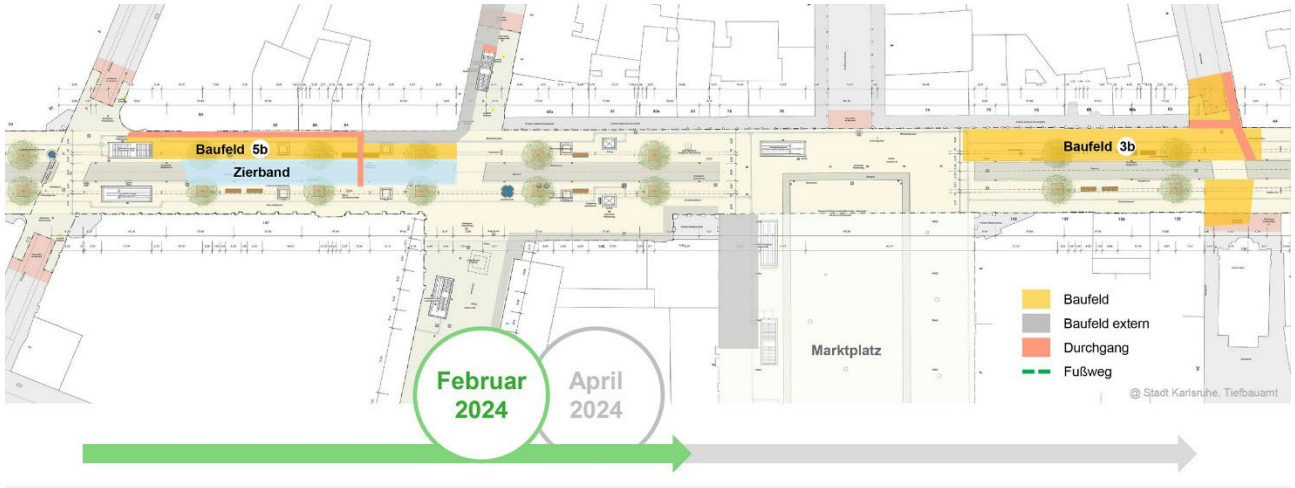


Abbildung 1: Baufelder Februar bis April 2024

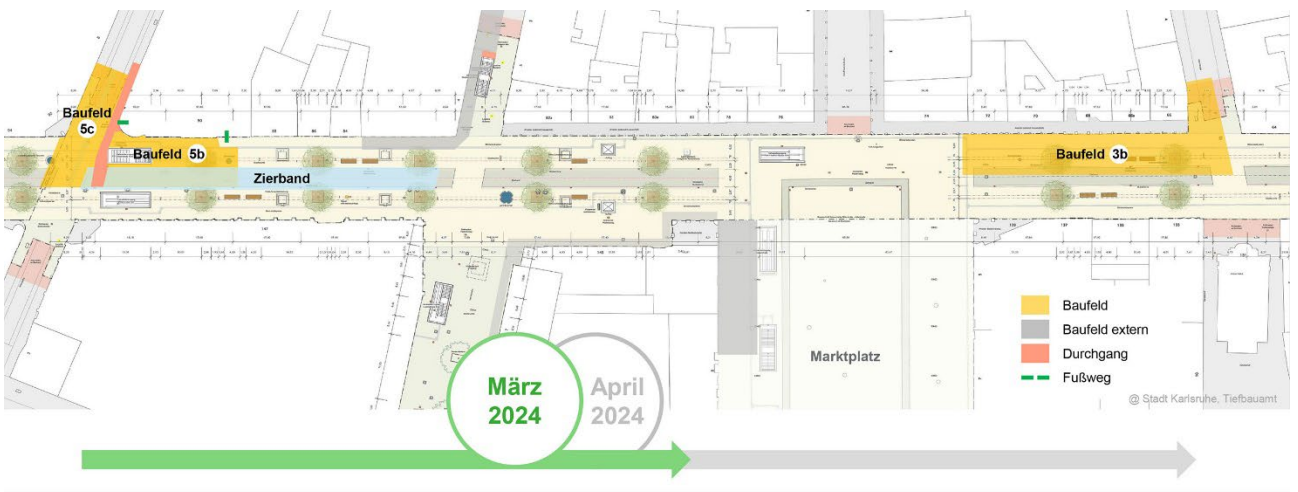


Abbildung 2: Baufelder März bis April 2024



## Bilder zu den bereits abgeschlossenen Arbeiten

Trotz der schwierigen Witterungsverhältnisse zu Jahresbeginn konnten wichtige Arbeitsschritte für die spätere Nutzung der Kaiserstraße umgesetzt werden. So wurden umfangreiche Leitungsbauarbeiten auf sehr engem Raum (Abbildung 4) ausgeführt und sogenannte Senk-Elektranten als unterirdische Versorgungsstationen installiert.



Abbildung 3: Herstellung der Senk-Elektranten



Abbildung 4: Detailreiche Leitungsverlegungen



Abbildung 5: Herstellung der Drainbetontragschicht



Abbildung 6: Winterarbeit bei Schneesturm



Abbildung 7: Rückbau der Gleisanlagen



Abbildung 8: Leitungsbau für Baumbewässerung

## Aktionen um das Baufeld

Gemeinsam mit der KME, der Karlsruhe Marketing und Event GmbH, hat die Projektleitung des Tiefbauamts ein umfangreiches Konzept zur Kommunikation mit Anliegern und Öffentlichkeit entwickelt.

Ziel dieses Konzeptes ist es, die Kommunikation zwischen Anliegern und dem Projektteam zu vereinfachen und durch gezielte Maßnahmen einen positiven Fokus auf die Baustelle und die Karlsruher Innenstadt zu legen.

## Fragen zum Projekt?

Bei Fragen zum Projekt oder den einzelnen Abläufen können sich gerne über die untenstehende E-Mailadresse an das Projektteam wenden oder die Baustellenabläufe auf der Internetseite zum Projekt einsehen.

**E-Mail:** [kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de](mailto:kaiserstrasse@tba.karlsruhe.de)

**Internet:** [www.karlsruhe.de/kaiserstrasse](http://www.karlsruhe.de/kaiserstrasse)



**Falls Sie zur Miete wohnen, bitten wir Sie, Ihre Vermieterin oder Ihren Vermieter zu unterrichten.**  
Wir bitten um Verständnis für die mit der Baumaßnahme verbundenen Störungen.

Aktuelle Informationen zu Straßenbaustellen im Stadtgebiet finden Sie unter [mobil.trk.de/karlsruhe](http://mobil.trk.de/karlsruhe).  
Informationen zu Änderungen bei Stadtbahnen, Straßenbahnen und Bussen unter [kvv.de](http://kvv.de).

